
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 17/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Yläpohjan ontelolaattojen saumavalut
- Matalan osan höyrynsulkukermi
- Patolevyjen asennusta
- Kattolohkot
- Maanrakennustöitä
- Katosten sokkelielementit



TYÖMAAN RESURSSIT




- Työmaalla työskenteli kuluneella viikolla
 - 2 Työnjohtajaa Sakela Rakennus Oy
 - 8 RAM Sakela Rakennus Oy
 - 2 RAM Rakennus Tanska Oy
 - 1 Hiab nosturiauto Nosto ja Kuljetus Visuri Oy
 - 1 Kaivinkoneen kuljettajaa Vieskan Maarakennus Oy
 - 2 RM Vieskan Maarakennus Oy
 - 4 RAM Vieskan Elementti Oy
-

KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

TR mittauksen tulokset 22.4.2026

95,2 %

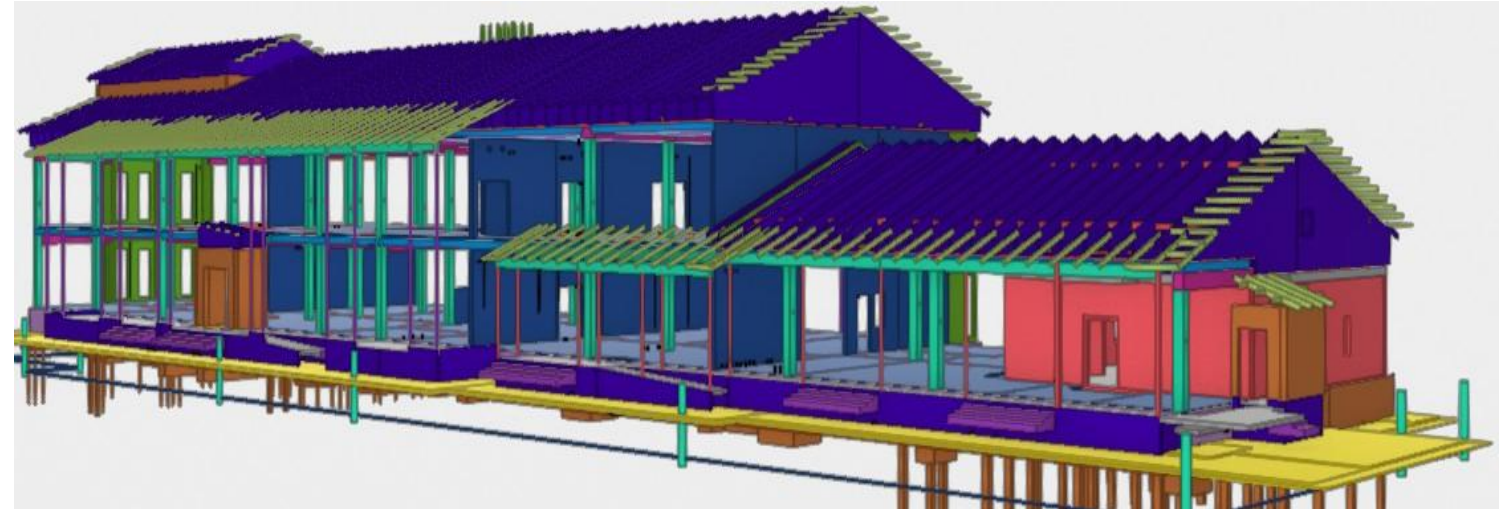

Rakentavin terveisin

Työpäällikkö Kalle Kinnunen, 050 421 1324, kalle.kinnunen@sakela.fi

Työnjohtaja Ossi Pokela, 044 783 3915 ossi.pokela@sakela.fi

Työnjohtaja Heikki Rissanen, 050 494 5514 heikki.rissanen@sakela.fi

TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA

- Puuseinäelementtien asennukset jatkuvat
- Kattolohkojen asentamien ja Vesikaton muut puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Sisään käynnin luiskat ja tasanteet
- Alapohjan lämmöneristystä



KUVIA TYÖMAALTA

Ulkopuolen sisääntulojen sokkelit asennettu ja patolevyt laitettu ensiviikolla eristyksiä ja sisä- ja ulkotäyttöjä



Ulkovaraston ja tekniikatilan pohjatyöt
käynnissä



Puuelementtiasennukset menossa



Matalan osan elementit asennettu

Seinän yläpäätsuojattu aluskatteella ja kaiteet
purettu maanantain kattolohkoasennusta varten



Sisäpuolelta puuelementtiasennusta



Kattolohkot pääosin valmiina

Matalan osan asennukset alkaa maanantaina



Höyrynsulku Kermit hitsattu

Isoihin iv läpimenoihin laitettu putkenpätkät ja
höyrynsulku tiivistetty

