

---

# INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU  
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 39/23

---



---

# TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Lohko A, seinäelementit asennettu.
  - Askeläänieristeen asennuksen valmistelutöitä.
  - 2krs. YP, höyrynsulku valmis.
  - Sähkö- ja putkitustöitä.
  - Pihan pintarakennustöitä.
  - Liimapuupalkkien asennusta.
  - Lattiakaivojen valutöitä.
- 
- Työmaalla työskenteli, 2 kaivinkonetta ja 2 apumiestä, lisäksi MRU:n työnjohtaja ja 3 elementtiasentajaa (seinäelementointi). 8 RAM (rakennusammattimies) ja 2 Huopamiestä. Pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Työturvallisuuskierros tehtiin perjantaina 29.9., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)



---

# TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Maanrakennustöitä.
- Askeläänieristeen asennus.
- Seinäelementtien asennusta, lohko C
- Kattoelementtien asennus, lohko A ja C
- Lattian liikuntasaurautojen asennus, lohko B



# KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset 29.9.2023

**96.5%**

TR mittauksen keskiarvo 95.8%




## Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, [jari.vilmi@sakela.fi](mailto:jari.vilmi@sakela.fi)

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, [jimi.kettunen@sakela.fi](mailto:jimi.kettunen@sakela.fi)

Työmaamestari Ante Taskinen, [ante.taskinen@sakela.fi](mailto:ante.taskinen@sakela.fi)

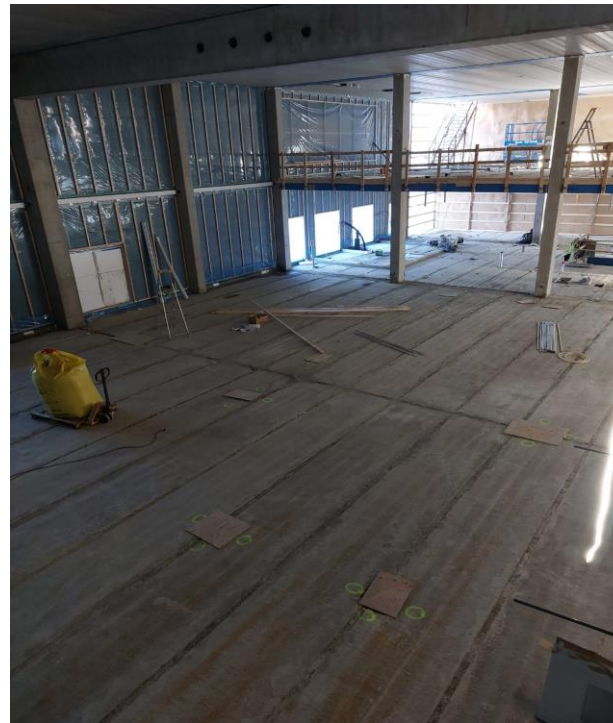

# VALOKUVIA

- Viikko 39, kuvia työmaalta.
- Seinäelementit, lohko A
- Liikuntasali



*Mukavaa Viikonloppua!*

Sakela Rakennus OY
