
INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 41/23



TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Askeläänieristeen asennusta, lohko A-C.
 - Lattialämmitysputkiston asennusta, lohko B-A.
 - Liikuntasaurautojen asennusta, lohko B.
 - Seinä- ja kattoelementointi valmis ja rakennuksen vaippa on ummessa.
 - Rakennusaikaisen kaukolämmön asennustöitä, valmis.
 - Sähkö- ja putkitustöitä.
 - Pihan pintarakennustöitä.
 - Lattiakaivojen valutöitä.
-
- Työmaalla työskenteli, 1 kaivinkone ja 2 apumiestä, lisäksi MRU:n työnjohtaja. 11 RAM (rakennusammattimies) ja pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Lisäksi 2 putkimiestä ja 2 sähkömiestä. Työturvallisuuskierros tehtiin perjantaina 13.10., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)



TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Maanrakennustöitä.
- Askeläänieristeen asennus jatkuu.
- Lattian liikuntasuomarautojen asennustyöt jatkuvat.
- Sisäänkäyntilaattojen rakennustyöt alkavat.
- IV- läpivientien tekoa ja IV-kojeiden laatikoiden asennusta vesikatolle.
- Kattopollareiden asennustyöt alkavat
- Lattiavalujen valmistelutöitä yleisesti.



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset .13.10.2023

97.2%

TR mittauksen keskiarvo 96.8%




Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, jari.vilmi@sakela.fi

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, jimi.kettunen@sakela.fi

Työmaamestari Ante Taskinen, ante.taskinen@sakela.fi

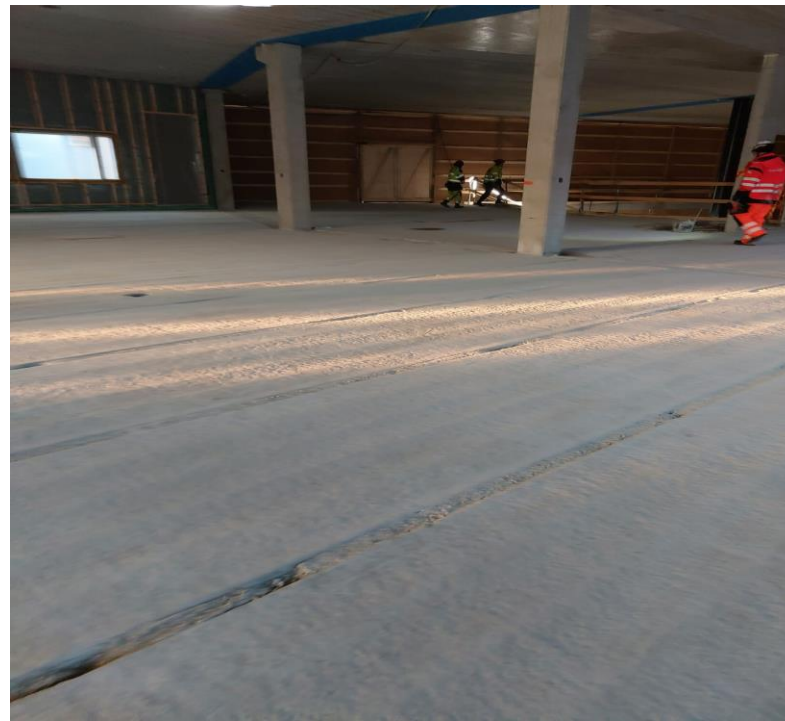

VALOKUVIA

- Viikko 41, kuvia työmaalta.
- Lattiavalujen valmisteluja.
- Lohko B, askeläänieristeen asennusta.



*Mukavaa
Viikonloppua!*

Sakela Rakennus OY

VIIKON KUVA

