
INARIN KIRKONKYLÄN KOULU

ALA- JA YLÄKOULU
UUDISRAKENNUS

Viikkotiedote 49/23



TONTILLA TAPAHTUNUT VIIME VIIKKOJEN AIKANA



Työmaalla on tehty kuluvan viikon aikana:

- Sähkö- ja putkitustöitä.
- YP- läpivientien valutöitä.
- Ullakkotilan IV:n eristystöitä.
- YP- läpivientien höyrinsulkutöitä.
- Räystäsrakenteiden rakennustöitä.
- Pintabetonointien hiontatöitä.
- Väliseinien rakennustyöt jatkuvat
- Maalaus ja tasoitetöitä.
- Betonielementtien puhdistustöitä.
- Lattian pintabetonointia, ruokasali ja lohko B, 2 krs. Sekä Lohko C, 2 krs.



- Työmaalla työskenteli, 5 RAM + 2RM (rakennusammattimies, rakennusmies) ja pääurakoitsijan työnjohto on päivittäin paikalla. Lisäksi 2 putkimiestä työskenteli tontilla. Lisäksi 2 sähkömiestä ja 3 väliseinääsentäjää. 2 maalaria ja 2 lattianhiojaa. Työturvallisuuskierros tehtiin torstaina. 7.12., TR- mittaus (tulokset sivulla 4)
-

TONTILLA TAPAHTUU SEURAAVAN VIIKON AIKANA



- Sisäänkäyntilaattojen rakennustyöt jatkuvat.
- Väliseinien rakennustöitä.
- Sähkötöitä.
- LVI- töitä.
- Maalaus- ja tasoitustöitä.
- Räystäsrakenteiden rakennustyöt jatkuvat.



KIITOKSET KULUNEESTA VIIKOSTA

Uudet TR mittauksen tulokset .7.12.2023

96.6%

TR mittauksen keskiarvo 95.6%




Rakentavin terveisin

Vastaava työnjohtaja Jari Vilmi, 044 794 5315, jari.vilmi@sakela.fi

Työmaainsinööri Jimi Kettunen, 050 556 7792, jimi.kettunen@sakela.fi

Työmaamestari Ante Taskinen, ante.taskinen@sakela.fi

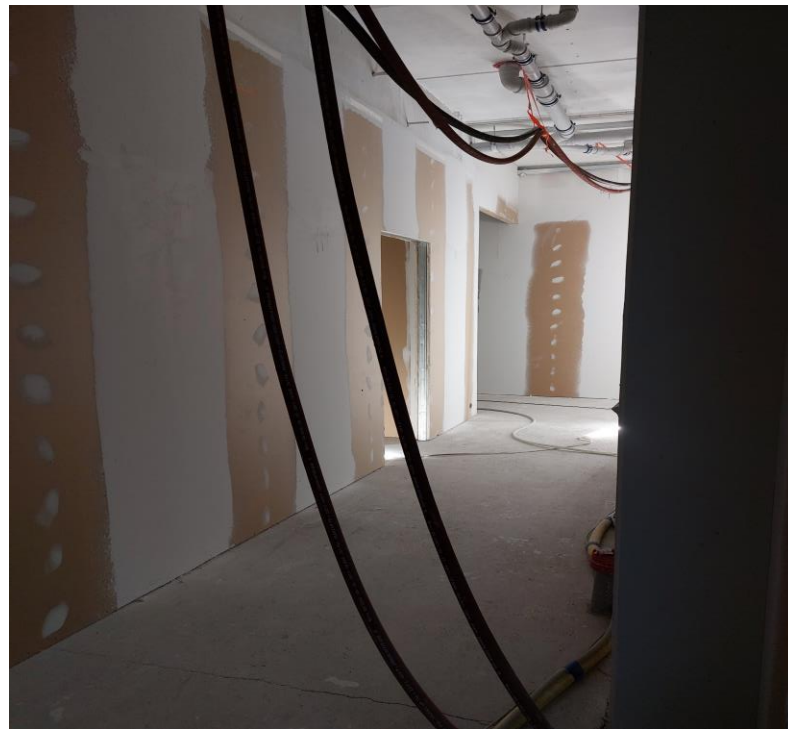

VALOKUVIA

- Viikko 49, kuvia työmaalta.
- Sisäpuolen tilannetta.
- Väliseinätöitä
- Lattian pintabetonointia.



*Mukavaa
Viikonloppua!*

Sakela Rakennus OY

VIIKON KUVA

