

TYÖMAATIEDOTE

[KELJONKANKAAN KOULU, SISÄILMA]

7.12.2018

Jälkkäritilojen remontti etenee nyt usealla eri työvaiheella. Ruiskutasoitukset on tehty ja seinien osalta on aloitettu Ardex F5 järjestelmän mukainen tasoitustyö. Samaan aikaan tiivistetään ikkunapenkkejä ja ikkunoiden ympäristöä, sekä ummistetaan viimeiset sähköläpivientien suojaputket.

Itsenäisyyspäivänä aloitettiin kattolevytyksen koolauksen teko, joka jatkuu myös tulevilla viikolla. Siinä vaiheessa, kun ikkunat on tasoitettu ja seinät ovat vailla pintatasoitusta, Vahanan Jyväskylä Oy tekee merkkiainemittaukset rakenteissa. Kaikki työvaiheet ja suunnitelmat dokumentoidaan ja taltioidaan niin kirjallisesti, kuin valokuvinkin, kuten on tehty tähänkin saakka.

Tulevalla viikolla jatkuu seinäpintojen ja ikkunanympäristysten tiivistäminen, sekä kattolevytyksen koolaus.

Luokkatila 1045, jossa oli pieni vesivahinko, on mitattu kuivaksi ja pinnoitettu käyttöön. Are Oy asentaa altaan paikoilleen vko 50 aikana.


Joululomalla teemme Aapiskukossa alakattokorjauksia, akustolevyn vaihtoja ja höyrynsulun/läpivientien tiivistyksiä. Työ aloitetaan 3D-luokasta ja sitä jatketaan aikataulun puitteissa luokkatila kerrallaan. Työtä jatketaan tarvittaessa hiihtolomalla. Koko korjaustyön ajan työporukan mukana kulkee Siivousliike Nybergin puhdistusryhmä, joka puhdistaa avatut akustokattojen läpuolet ja työalueet rakennustöiden tahtiin.



Kertopuukoolaus ristinkoolataan laudalla ennen palo- ja N-kipsilevyjen asennusta.



Kun tiivistykset on saatu valmiiksi, merkkiainekokeilla varmistetaan niiden pitävyyttä.

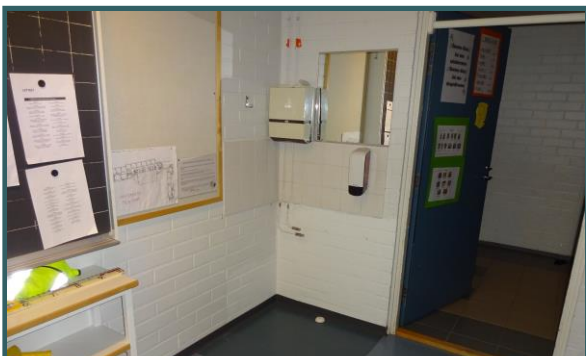

Luokkaan 1045 asennetaan käsienspesuallas viikolla 50.



Joululomalla aloitetaan Aapiskukon kattoakustojen vaihto.
