
KOIVUPUHDON KOULU



Viikkotiedote 24/2026

TYÖMAALLA TAPAHTUNUT KULUNEEN VIIKON AIKANA

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Vesikaton puutyöt
- Ulkokatokset
- Pintalattiat
- Konesaumapeltikate
- Maanrakennustöitä
- Sähkötyöt
- Putkityöt



TYÖMAALLA TULEVALLA VIIKOLLA


- Vesikaton puutyöt
- Maanrakennustyöt
- Ulkovaraston perustyöt
- Pintalattia työt ja valut
- LVIS työt
- Konesaumapeltikaton teko
- Väliseinätöiden aloituksen valmistelut



1 kerroksen toinen valulohko valettiin torstaina



Lattioiden jälkihoito käynnissä ja viime viikolla valetulla alueella aloitettu sementtiliiman poisto hiotaan ennen väliseiniä

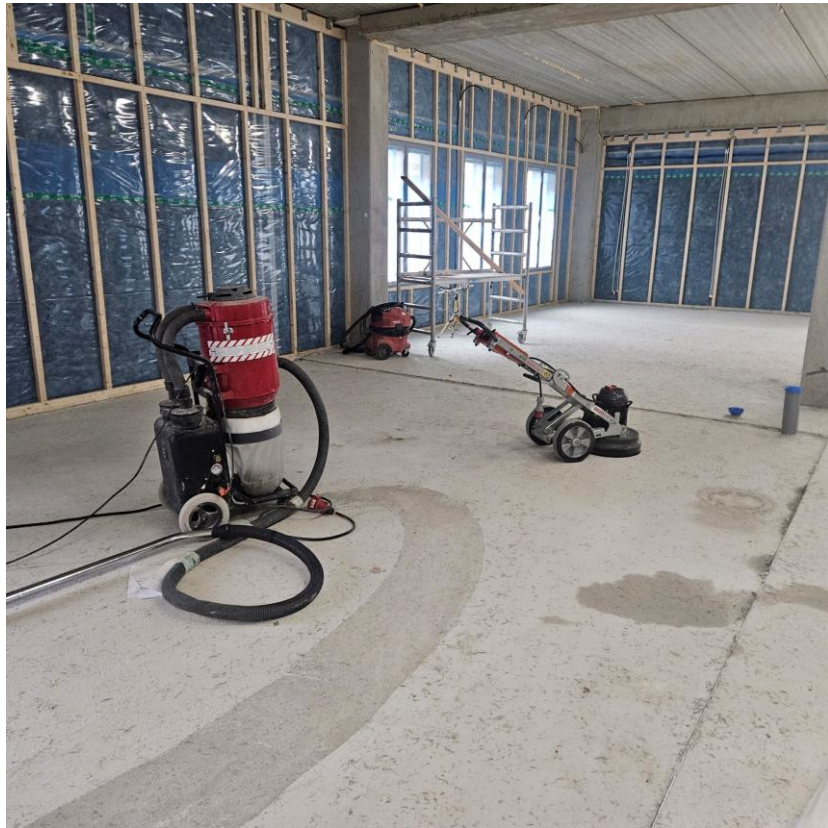

1 krs Viimeinen lattiavalu lohko ensiviikolla
valussa



Matalan osan konesaumapeltikatteen asennus edennyt ensiviikon jälkeen siirrytään pääkatolle



Alushuovan asennusta korkealla katolla



IV asennukset ullakolla edenneet



Pumppaamon montun louhinta



Maalämmön poraukset saatu valmiiksi

