
Tiedote vko 30

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 28.07.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 30

Tervehdys koulutyömaalta!

Väistötilat on nyt käyttöönottotarkastettu ja luovutettu Tilajalle joten muuttohommat voivat ensi viikon alusta alkaa. Vanhalla puolella vesi- ja lämpölinjat on tehty, maannatana tehdään painekokeet, putkieristäjä saapuu myös maanantaina tekemään omat hommansa pois. Sähkökytkennät ja automaatio puuttuu, mutta nekin tulevat ensi viikolla kytkettyä. Maanrakennus on edennyt laajennusosalla, toki vielä on paljon tehtävää, että saamme kaikki anturat tehtyä, mutta onneksi pohjat ovat laajalla alueella niin voimme tehdä montaa eri työvaihetta yhtä aikaa. Loma-aika mennä heilahti ja ensi viikon alusta tuleekin lomalaiset takaisin töihin ja alkaa arkinen aherrus.

Hyvää kesän jatkoa!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Vesijohto vedetty



Salaojia tehty



Kivikasa

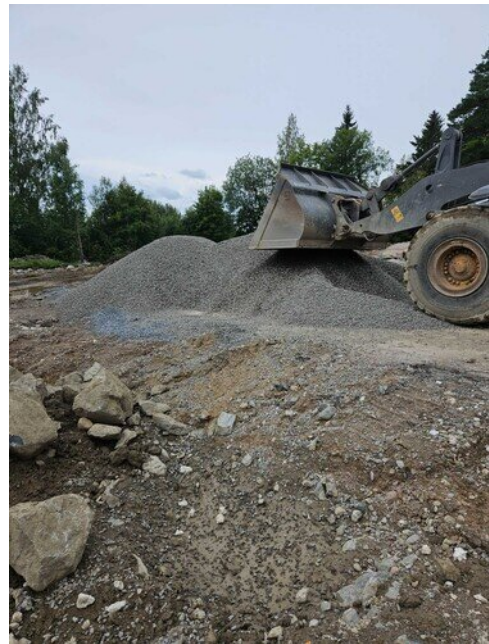

Salaojamursketta



Yleiskuva työmaasta



Väistötiloilla viimeiset lukitukset teon alla
