
Tiedote vko 36

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 08.09.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 36

Tervehdys koulutyömaalta!

Ulkoseinä ja väliseinäelementit saatiin tällä viikolla asennettua paikoilleen 1 kerroksen osalta, 80 betonielementtiä Alavuden Betonilta meni paikoilleen kuin itsestään. Tänään juotetaan pystysaumot, jotta ensi viikon tiistaista alkaen saadaan laitettua välipohja ontelolaatat paikoilleen. Sitä ennen asennetaan myös pilarit ja Käärijän vihreät Deltapalkit. Ensi viikolla on siis onteloasennusviikko, tiistaista perjantaihin on asennuksia ja 17 kuormaa on tulossa, Sen jälkeen tulee pieni tauko elementtiasennuksista, juotetaan kenttä kiinni ennen kun alamme nostamaan 2 kerrosta paikoilleen.

Hyvää syksyä!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Yleiskuva saattoparkista liikuntasalin nurkalle



Liikuntasalin ja teknisentyön suunnittelun ulko-ovien paikat



Teknisentyön luokkaa sisältä päin

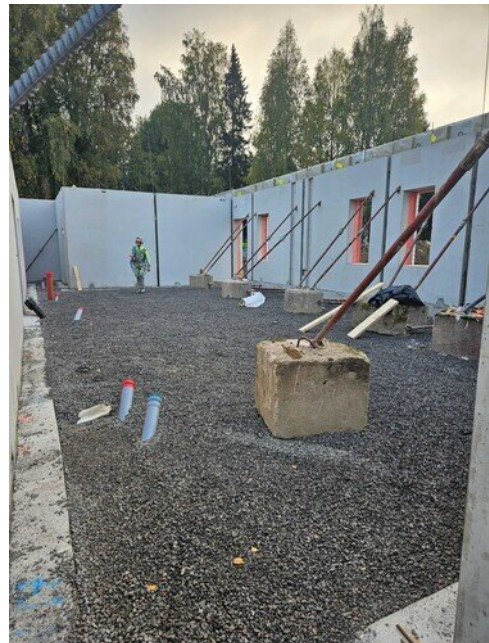

Pukuhuoneet rakentuvat tähän, taustalla musiikkiluokka



Takapihan sisäänkäynnin vasemmalta puolelta kuva



Pääsisäänkäynnin sisänurkka



Sadevesiviemäreiden asennus etupihalle



Yleiskuva liikuntasalisiipeen päin



Yleiskuva aulaan ja teknisentyön luokkiin päin



Käärijän vihreät Deltapalkit odottavat asennusta
