

---

## Tiedote vko 46

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 17.11.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 46

Tervehdys koulutyömaalta!

Sääsuoja on nyt valmis ja vesikattotyöt aloitettu sääsuojan alla. Sisällä on väliaikaiset lämmittimet viritelty valmiiksi, maanantaina laitetaan lämminvesi kiertämään lämppäreihin, sitten alkaa rakennus kuivumaan! Talvi onkin parasta kuivumisaikaa, toivotaan kirpeitä pakkasia. Sisällä aloitellaan LV-S asennuksia, IV-konehuoneen lattia valetaan tiistaina, myös betonipintojen jälkityöt aloitetaan pikapuolin.

Hyvää alkutalvea!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Väliaikaiset vesikiertoiset lämmittimet paikoillaan, 8 kpl.




Liikuntasalissa savunpoistoikkunat paikoillaan

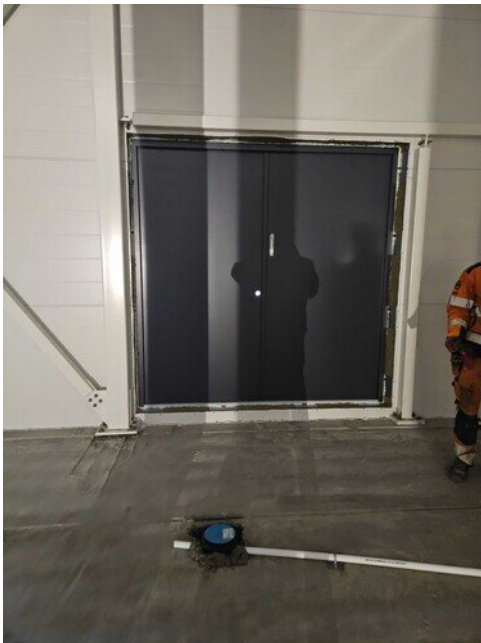


IV-konehuoneessa ulko-ovet asennettu

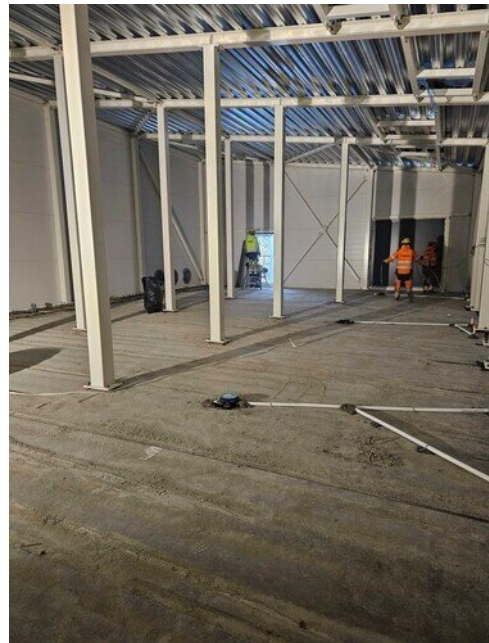

IV-konehuoneessa ulko-ovet asennettu

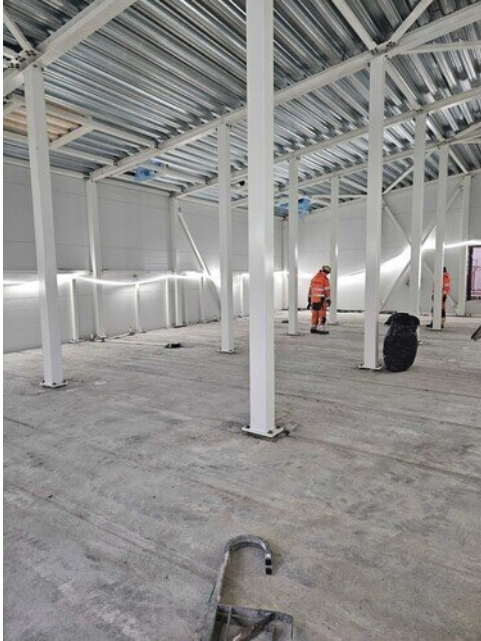

IV-konehuoneen lattia valetaan tiistaina

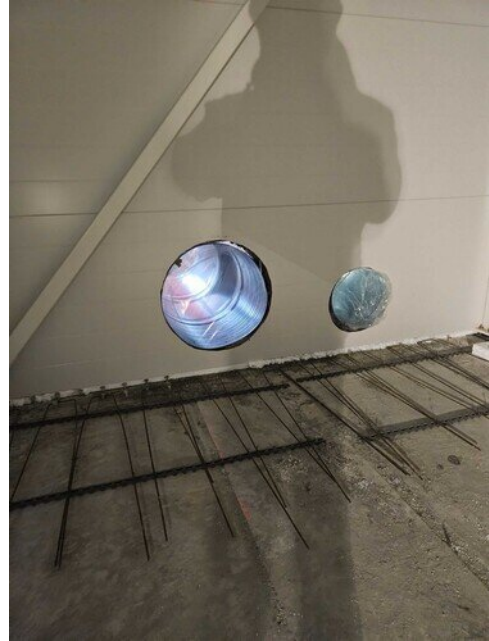


IV-asennukset aloitettu ullakolla




Vesikattotyöt käynnissä



Vesikattotyöt käynnissä

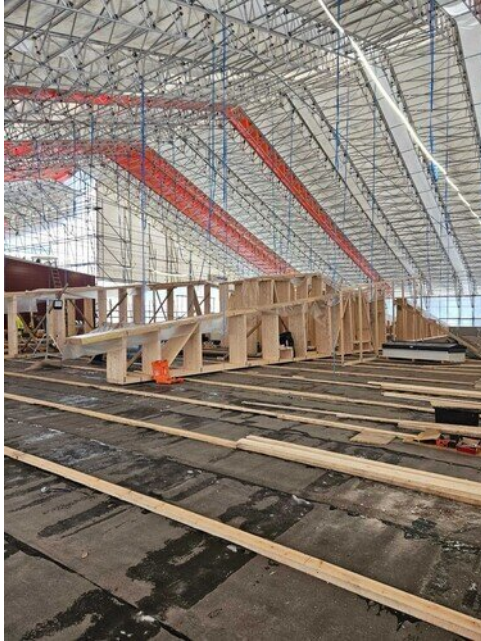

Vesikattotyöt käynnissä

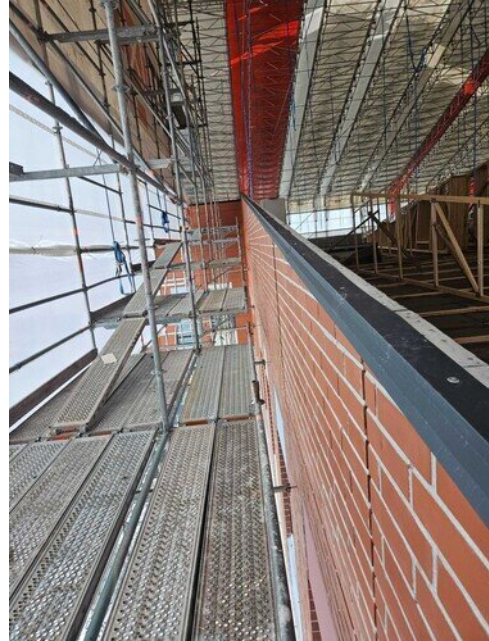

Telineet kiertää koko laajennuksen



Telineet kiertää koko laajennuksen
