

Tiedote vko 49

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 08.12.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 49

Tervehdys koulutyömaalta!

Katto on edennyt nyt vauhdilla, vesikateasennus alkoi eilen. Ensi viikolla nostetaan loput huovat ja raakapontit sääsuojan sisään, kattotyöt ovat siis hyvällä mallilla. Väliseinäasennukset alkoivat tänään yhden asentajan voimin, ensi viikolla tulee siihen työhön apuvoimia. Väliseinämuuraukset alkavat myös ensi viikolla, tiistaina tulee tiilikuorma tontille. Pölynsidontamaalaukset kattoon saatiin tänään tehtyä ja tekniikka asennukset voivat siltä osin alkaa. IV-koneiden asennus on alkanut myös tänään.


Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi

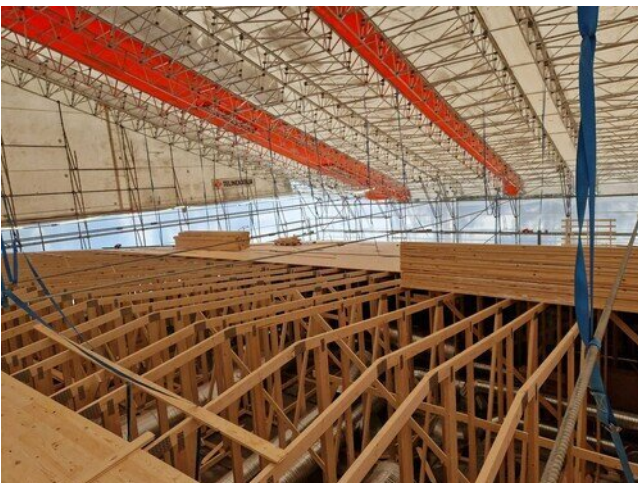

Vesikatolla Uotsolantien puolella menoillaan raakapontin asennus.

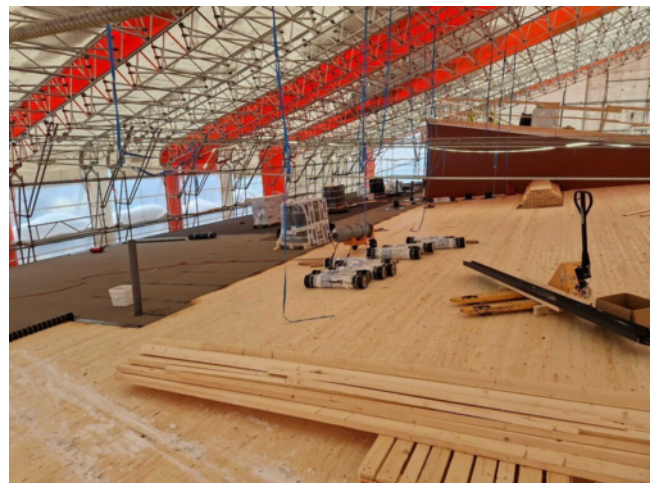

Vesikatolla järvenpuolella asennetaan pohja- ja pintahuopaa, sekä kattoläpivientejä.



IVKH:ssa iv- koneet nostettu konehuoneeseen ja TK25 asennus alkanut.



2. kerroksessa tehty viemärihajoituksia ja pölynsidontamaalausta.



2.kerroksessa pintalattiavalun valmisteluja menoillaan.



1.kerroksessa pölynsidonta tehty ja väliseinien teko alkanut.
