

---

## Tiedote vko 50

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu  
Osoite: Uotsolantie 30  
Pvm: 15.12.2023  
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava  
työnjohtaja

---

## Tiedote vko 50

Tervehdys koulutyömaalta!

Vesikatteen asennus on edennyt yli puolen välin ja tulee valmistumaan ennen joulua. IV-konehuoneen kattoon kun saadaan vielä asennettua raakapontti, niin sitten saadaan sekin tehtyä pintoihin, ensi viikko on varattu siihen aikaa. IV-konehuoneessa ovat itse koneet hahmollaan, kanavointihommaa siellä vielä riittää pitkäksi aikaa, kanavat ovat isoja ja hankalia käsitellä. 2 kerrokseen saatiin valettua ensimmäinen osa pintalaatasta, ensi viikolla valetaan loput osat eli joululoman saa lattia rauhassa kuivahtaa, uudenvuoden jälkeen myös siellä alkaa kiivas väliseinien teko. 1 kerroksessa on teknisentyön seinät pystyssä ja suurin osa levytetty toiselta puolelta, talotekniikkaa niihin tulee jonkin verran sisälle jonka jälkeen voidaan levyttää seinät toiseltakin puolelta. Muurattujen seinien muuraustyöt käynnistyivät myös tällä viikolla, toinen muurari tulee maanantaina, saadaan myös muurauksia sitten hyvin eteenpäin.

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/

Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi


www.kynnos.fi




Ensimmäinen osa valettu 2 krs pintalaatasta, jälkihoito menossa.




Vanhan ja uuden osan liitoksen paneloitua ulkoseinää

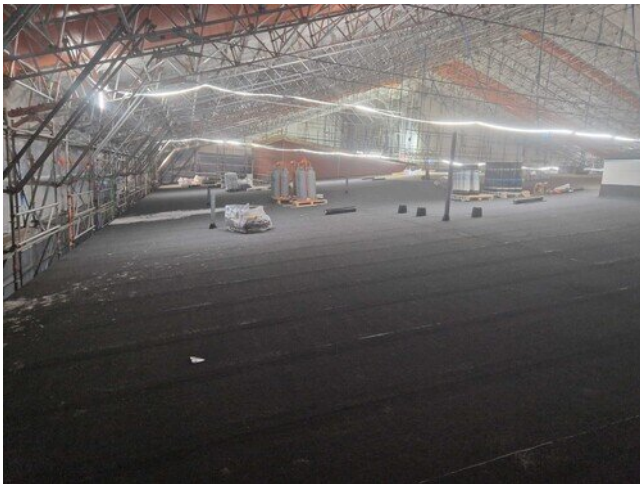

Valmista kattopintaa järven puolella

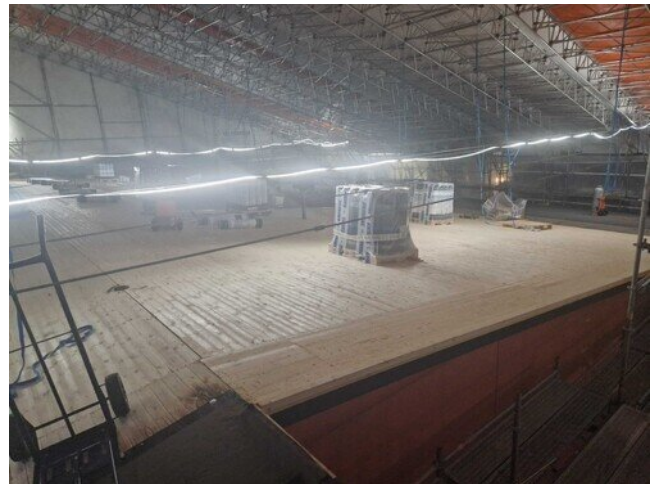

Huopatyöt menossa Uotsolantien puolella

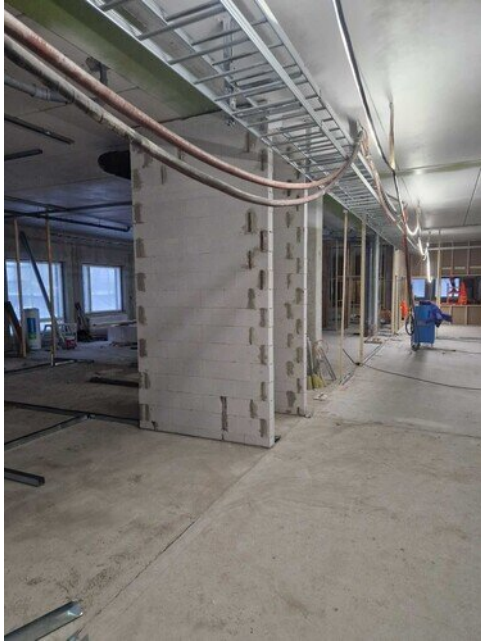

Muuraukset alkaneet 1 krs



Teknisentyön luokkien väliseiniä



IV-koneet hahmollaan
