

TYÖMAATIEDOTE

[KELJONKANKAAN KOULU, SISÄILMA]

5.11.2018

Keljonkankaan koulun Jälkkäritilojen purkutyöt on tehty ja tällä hetkellä tehdään tiivistys- ja lattiarakenteiden perustustöitä. Tilasta poistettiin käytännössä kaikki pinta materiaali ja tila hiilihappojää puhallettiin pintojen desinfiomiseksi.


Infotilaisuudessa 29.10. yhdessä sovitun mukaisesti työmaalle kulku siirretään rakennuksen ulkopuolelle tämän viikon alussa (nousutornin osat saapuivat tontille 2.11.) ja siihen saakka Siivousliike Nyberg puhdistaa nykyisen kulkuportaikon päivittäin. Samaisessa tilaisuudessa sovitun mukaisesti kovaa ääntä aiheuttavat työvaiheet tehdään arkisin ennen klo 8:aa tai klo 16 jälkeen. Rehtorin huoneen puoleisen portaikon oveen asennettiin ääntä eristävä seinä.

Viikolla 45 jatkamme lattiarungon ja lattiapohjan tekoa ja viikon 46 alussa päästään ruiskutasoittamaan seinäpintoja. Vahanan Jyväskylä Oy tekee laadunvarmistuksen merkkiainekokeilla, ennen pintojen loppukäsittelyä.


Luokan 1045 (allaskaapin vesivahinko) kosteusmittaukset tehdään seuraavan kerran viikon 45 alussa, jolloin saadaan aikataulua vahinkoalueen takaisinrakennukselle. Luokkien allaskaappien lattioiden ja seinien pintakosteusmittaukset saadaan samoin päätökseen viikon 45 aikana.



Tilan hiilihappojääkäsittelyn jälkeen läpiviennit paikattiin ja tiivistettiin, lattian ja seinän raja tiivistettiin ja lattiapinta pölynsidottiin.

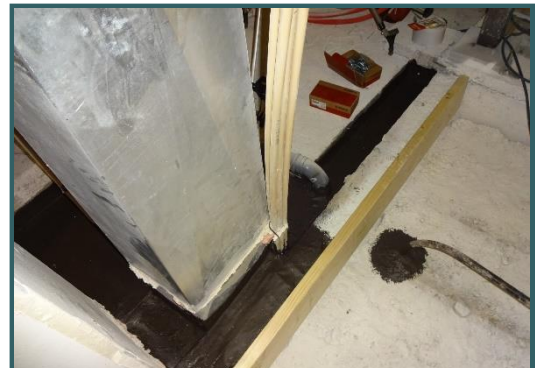

Kaikki lattian läpiviennit on tiivistetty.

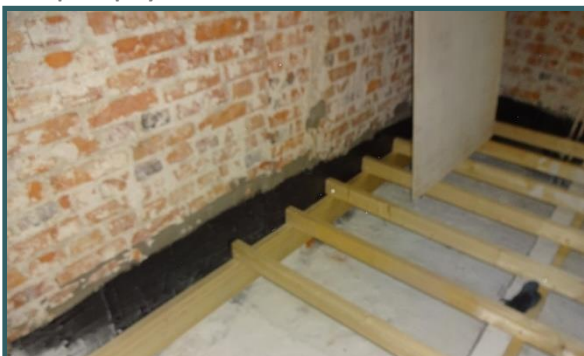

Lattiarunko koolataan tulevan levyrakenteen pohjaksi.



Lattian pohjarakenteiden teko on aloitettu. Seinät tasoitetaan ja tiivistetään lattiarungon päältä.
