
Tiedote vko 44

Kohde: Mouhijärven yhteiskoulu
Osoite: Uotsolantie 30
Pvm: 03.11.2023
Laatija: Jarno Valkama

Osallistujat: Jarno Valkama

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy, Vastaava
työnjohtaja

Tiedote vko 44

Tervehdys koulutyömaalta!

Tiistaina saimme maan valkoiseksi ja talvi tuli kerralla Pirkanmaalle. Työmaa oli onneksi siinä vaiheessa että lumisade ei töitä suoranaisesti haitannut, tavarantoimituksia kylläkin. Sääsuojat alkavat olemaan rungon osalta kasassa, maanantaina nostetaan vielä viimeiset ristikot siihen ja sen jälkeen alkaa pressutus. Ensi viikon aikana on siis rakennus sääsuojan alla. Sen jälkeen alkaa kova rypistys, että saamme varsinaisen katon tehtyä, siinä onkin tavallista enemmän käsityötä kun sääsuojan alla ei pysty nosturilla toimimaan ja nostamaan esim. painavia kattotuoleja paikoilleen. Mutta uskon että siitäkin selvitään ja saadaan katto tehtyä valmiiksi. Sisällä on lattiaa valettu noin puolet maanvaraisesta laatasta, ensi viikolla valetaan vielä kaksi lohkoa, jonka jälkeen jää jäljelle aula, johon pinnoitteen tulee hiottu betoni. Sen valaminen tarvitsee lämmöt päälle, joten se menee parin viikon päähän. Ikkunoita on alettu asentamaan 2 kerrokseen, tähän työhön tulee tauko ensi viikolla, kun keskitytään pelkästään katon tekemiseen.

Muistuttaisin vielä että tämä rakennustyömaa on nyt vaarallisimmillaan ja täällä käyminen tai oleskelu omin päin, on ehdottomasti kielletty!

Hyvää alkutalvea!

Terveisin,

Rakennustoimisto Pekka Kynnös Oy/


Jarno Valkama 040-8356307

jarno.valkama@kynnos.fi

www.kynnos.fi




Ensimmäiset kattoristikot nousee sääsuojarungon päälle.

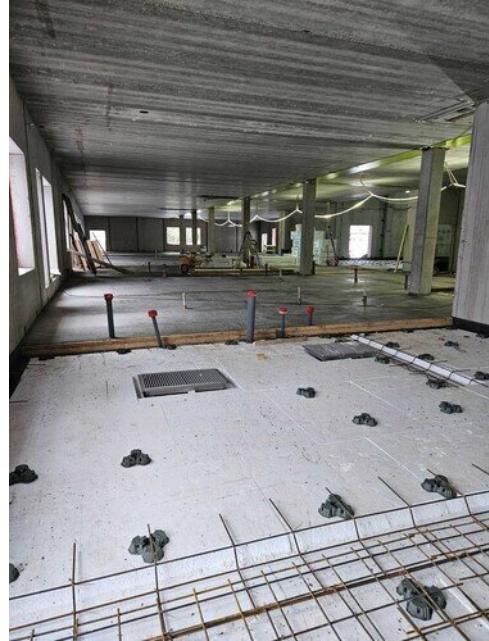

Osa latioista valettu 1 kerroksessa



Liikuntasali valetaan torstaina

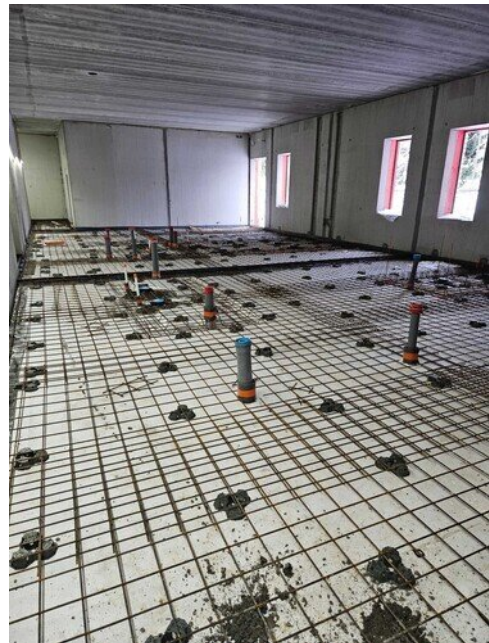

Sosiaalitalaosa valetaan tiistaina



Ikkunoita asennettu 2 kerroksessa



Sääsuojan runkoa yläpihalta päin



Sääsuojan korkeus hahmottuu tästä kuvasta parhaiten
