JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU

TIEDOTE

# TIEDOTE KESKI-PALOKAN KOULULLE JA STEINER-PÄIVÄKODILLE (PIKKU-OTAVA) KÄYTTÄJILLE JA HENKILÖKUNNALLE 5.12.2017

Haukkamäen päiväkodille, osoitteeseen Korppumäentie 1, tehdään lisätiloja alakentälle.

Maanrakennustyöt ovat käynnissä piha-alueella ja ne valmistuvat tämän viikon aikana. Vain sähköliittymän ja kuitukaapelin kaivuutyöt siirtyvät myöhemmäksi.

Ilmoittaisin, että viipaleen perustustyöt aloitetaan ma 11.12. aikana. Viipalerakennusta pystytetään ke 13.12. alkaen max 2 työpäivää. Viipaleosat saapuvat rekkakuormissa pääkaupunkiseudulta ja asennus tapahtuu välittömästi kuorman saavuttua. Nostotyöt tehdään päiväkodin alatien kautta nosturin avulla ja kestää max 2 työpäivää. Nostoalue tullaan erottelemaan muusta alueesta työmaapuomein ja kieltomerkein. Alueella tulee liikkumaan työkoneita ja rekka-autoja. Pyydämme alueella liikkuvia varovaisuuteen. Työ- ja nostoalueelle on ehdottomasti asiattomilta pääsy kielletty.

## TYÖMAASUUNNITELMA

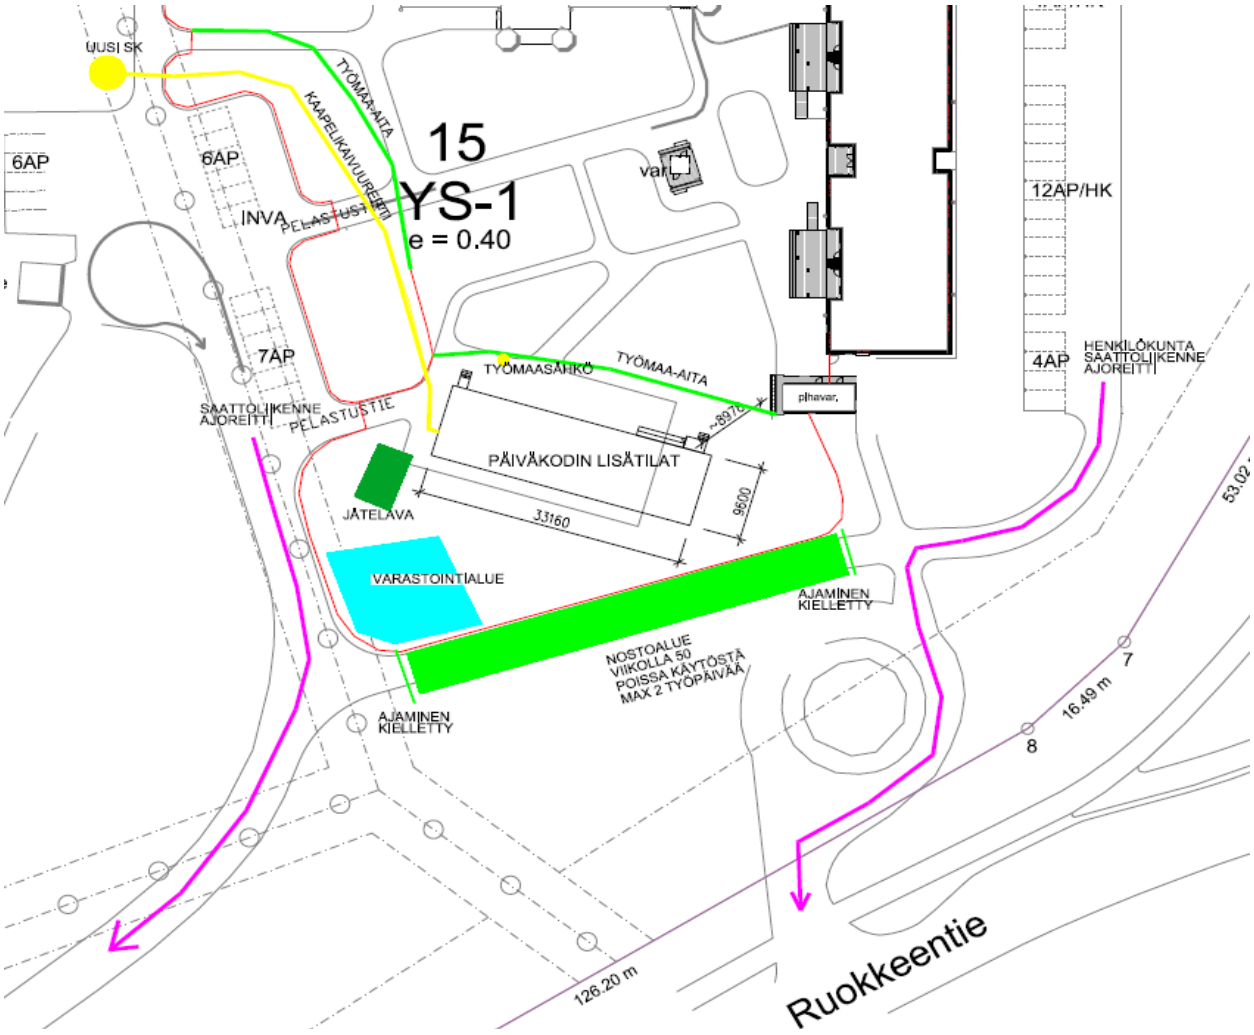


Jyväskylän Tilapalvelu psta

valvoja Miija Taponen puh. 040 7499 341
