Liite khall 7.5.2018 § 83
Liite kvalt 14.5.2018 § 14
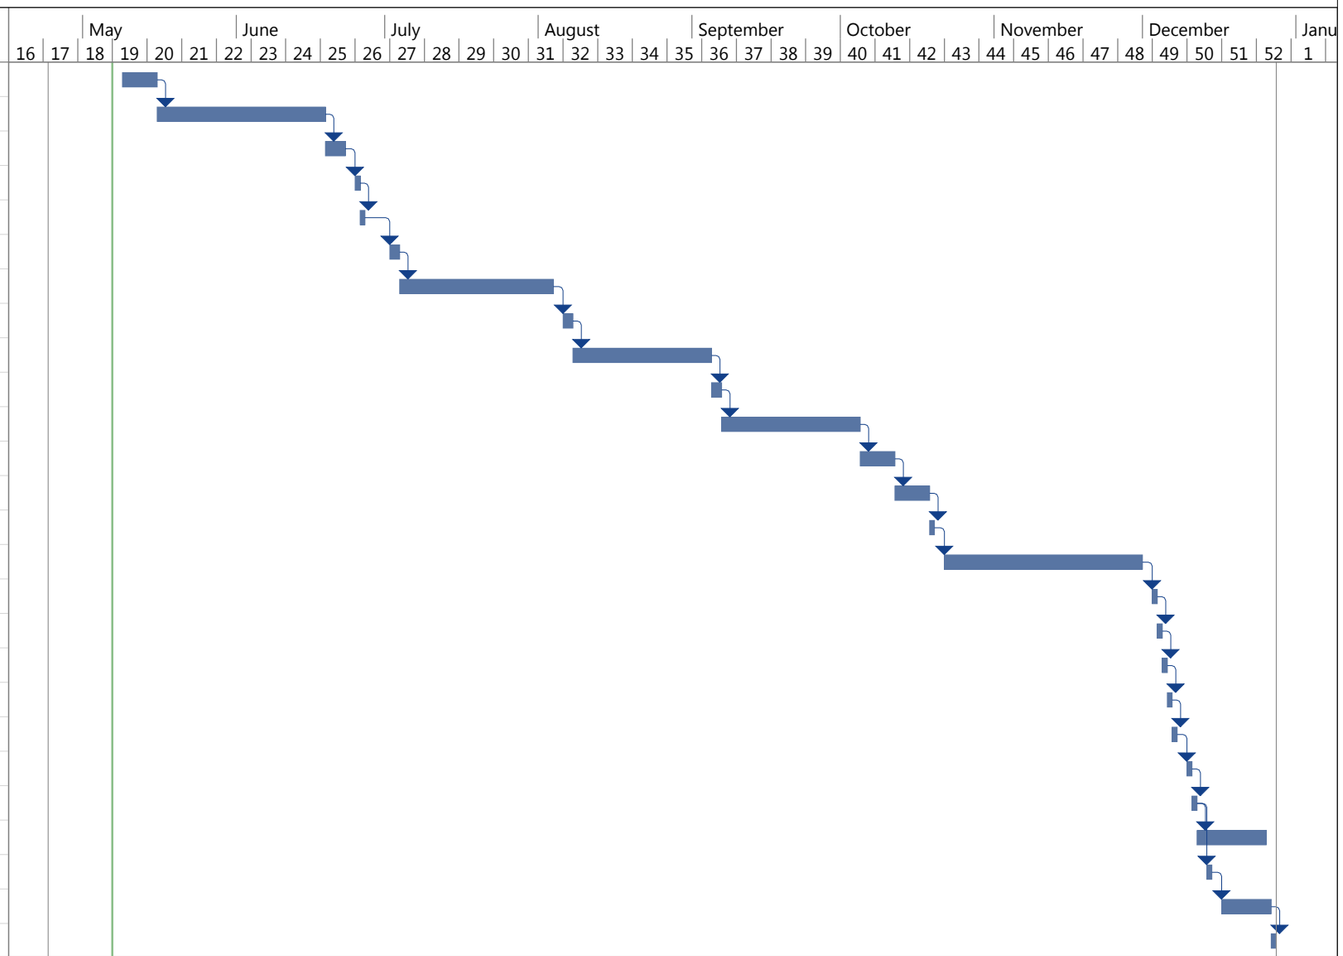
ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Hankintailmoituksen laatiminen ja julkaisu	5 days	9.5.2018	15.5.2018
2	Osallistumishakemusten jättäminen	24 days	16.5.2018	18.6.2018
3	Osallistumishakemusten käsittely	4 days	19.6.2018	22.6.2018
4	Tarjoajien valinta ja päätös neuvotteluun kutsuttavista	1 day	25.6.2018	25.6.2018
5	Tiedoksianto ja neuvottelukutsujen lähettäminen	1 day	26.6.2018	26.6.2018
6	1. Neuvottelukierros	2 days	2.7.2018	3.7.2018
7	Tilaaja muokkaa tarjouspyyntöä ja tarjoajat työstävät ratkaisuja	23 days	4.7.2018	3.8.2018
8	2. Neuvottelukierros	2 days	6.8.2018	7.8.2018
9	Tilaaja muokkaa tarjouspyyntöä ja tarjoajat työstävät ratkaisuja	20 days	8.8.2018	4.9.2018
10	3. Neuvottelukierros	2 days	5.9.2018	6.9.2018
11	Tilaaja muokkaa tarjouspyyntöä ja tarjoajat työstävät ratkaisuja	20 days	7.9.2018	4.10.2018
12	Tarjoajat kommentoivat hankinta-asiakirjat	5 days	5.10.2018	11.10.2018
13	Tarjouspyynnön kehittäminen kommenttien pohjalta	5 days	12.10.2018	18.10.2018
14	Lopullisen tarjouspyynnön julkaiseminen	1 day	19.10.2018	19.10.2018
15	Tarjouslaskenta-aika	30 days	22.10.2018	30.11.2018
16	Tarjousten jättäminen	1 day	3.12.2018	3.12.2018
17	Tarjousten arviointi	1 day	4.12.2018	4.12.2018
18	Kunnanhallituksen listalle	1 day	5.12.2018	5.12.2018
19	Kunnanhallituksen kokous	1 day	6.12.2018	6.12.2018
20	Kunnanvaltuuston listalle	1 day	7.12.2018	7.12.2018
21	Kunnanvaltuuston kokous	1 day	10.12.2018	10.12.2018
22	Valintapäätös tiedoksi sähköisesti	1 day	11.12.2018	11.12.2018
23	Odotusaika ja hankintapäätöksen laatiminen	10 days	12.12.2018	25.12.2018
24	Sopimuskatselmus	1 day	14.12.2018	14.12.2018
25	Sopimuksen laatiminen	8 days	17.12.2018	26.12.2018
26	Sopimuksen allekirjoitus	1 day	27.12.2018	27.12.2018
